



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONY 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO OGU
APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL	MUNICÍPIO / UF PALMITAL/PR		REPASSE 0,00	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 0,00	Nº RRE 3

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: mar-21	100,00%
--------------------------------	-----------------------------------	---------

Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-117.524,16

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE	Em Análise	1	un	0	3	117.524,16	56.096,45	11.866,00	67.962,45	57,83%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(47,73%)	(10,10%)	(57,83%)		
							Repasso	-	-	-	-	
							Contrapartida	117.524,16	56.096,45	11.866,00	67.962,45	57,83%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	117.524,16	56.096,45	11.866,00	67.962,45	

Acumulado Anterior: 47,73%

Observações:

terça-feira, 30 de março de 2021

Data

PALMITAL/PR
Local

Representante Tomador

Nome: ANTONIO MACHADO DE JESUS FILHO

Cargo: PRESIDENTE DA CÂMARA

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: MAREISE AMARAL DOS SANTOS

Profissão: ENGENHEIRA CIVIL

CREA/CAU: 168.317/D

ART/RR: 1720210542962

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: MONICA LAIS KUZNHARSKI

Cargo: TECNICA DE CONTROLE



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO: 0 Nº SICONV: 0 Nº CTEF: 0
 PROPONENTE TOMADOR: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL APELIDO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL NOME DA EMPRESA: THAYWAN DOS PASSOS E CIA LTDA
 Medição: 3 Período: 25/02/2021 a 30/03/2021 % Realizado Período: 10,10% % Realizado Acum.: 57,83%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	AMPLIAÇÃO CÂMARA DE PALMITAL																									

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

1	Administração Local																									
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																									
4	ESTACAS E BLOCOS																									
5	VIGAS BALDRAMES																									
6	PILARES																									
7	VIGAS																									
8	VERGAS E CONTRA VERGAS																									
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS																									
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS																									
11	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METÁIS																									
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									
13	ALVENARIA																									
14	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNO																									
15	ESQUADRIAS																									
16	PISOS INTERNOS																									
17	ESCADA																									
18	COBERTURA																									
19	FORRO																									
20	PINTURAS																									
21	ÁREA PERMEAVEL																									
22	LIMPEZA FINAL DA OBRA																									

		Data das Medições														
		02/02/2021	24/02/2021	30/03/2021	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
%		24,43%	23,30%	10,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
R\$		28.712,41	27.384,04	11.866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%		24,43%	47,73%	57,83%	57,83%	57,83%	57,83%	57,83%	57,83%	57,83%	57,83%	57,83%	57,83%	57,83%	57,83%	57,83%
R\$		28.712,41	56.096,45	67.962,45	67.962,45	67.962,45	67.962,45	67.962,45	67.962,45	67.962,45	67.962,45	67.962,45	67.962,45	67.962,45	67.962,45	67.962,45

Marelice Amaral dos Santos
 Responsável Técnico pela Fiscalização
 Nome: MARELISE AMARAL DOS SANTOS
 Profissão: ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/CAU: 168.317/D
 ART/IRRT: 1720210542962

PALMITAL/PR
 Local
 terça-feira, 30 de março de 2021
 Data

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: THAYWAN DOS PASSOS E CIA LTDA-ME

CNPJ: 22.373.376/0001-84

TOMADA DE PREÇOS N°: 02/2020

CONTRATO N°: 10/2020


MEDIÇÃO: 03

DATA: 30/03/2021


PERÍODO: FEVEREIRO E MARÇO DE 2021.




EXECUÇÃO DE PISOS
IMAGEM 01

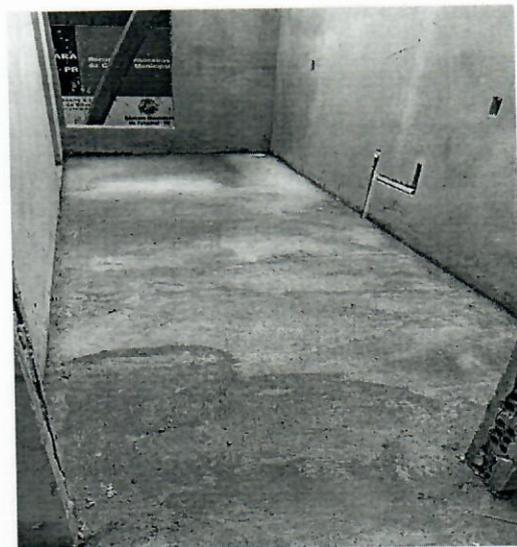

EXECUÇÃO DE PISOS
IMAGEM 02

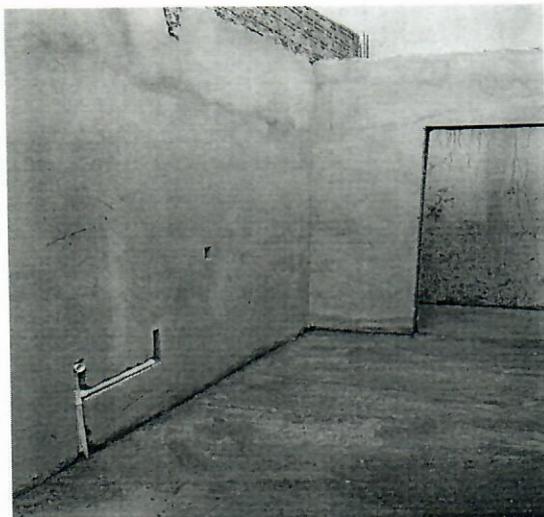

INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA
IMAGEM 03

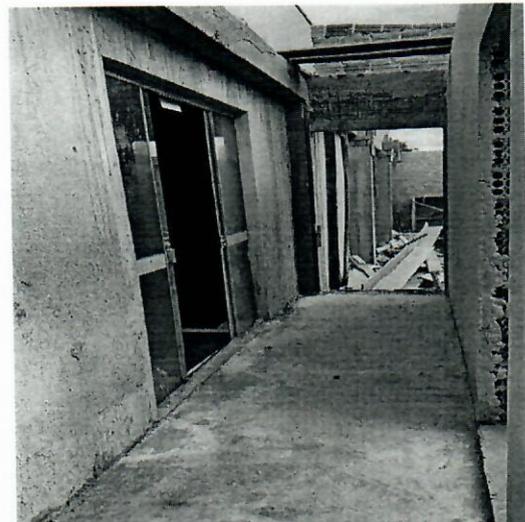

EXECUÇÃO DE PISOS
IMAGEM 04

Palmital, 30 de março de 2021.

Marelise Amaral dos Santos

Marelise Amaral Dos Santos
CREA-PR 168.345/D
