



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL	Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):		RECURSO OGU
Apelido do Empreendimento AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL	MUNICÍPIO / UF PALMITAL/PR	Valor Total (R\$)	Repassado	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO	Nº RRE 1
Situação do TC/CR: Atrasada		117.524,16	0,00	0,00	
Percentual previsto em: jan-21		100,00%	Repassado (R\$)	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO	
			-	0,00	
			Contrapartida (R\$)		
			-117.524,16		

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jan-21	100,00%
--------------------------------	-----------------------------------	---------

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado Incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL	Em Análise	1	un	0	1	117.524,16	-	28.712,41	28.712,41	24,43%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(0,00%)	(24,43%)	(24,43%)		
							Repassado	-	-	-	-	
							Contrapartida	117.524,16	-	28.712,41	28.712,41	24,43%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	117.524,16	-	28.712,41	28.712,41	

Observações:

PALMITAL/PR  
Local

sexta-feira, 29 de janeiro de 2021  
Data

  
Representante Tomador  
Nome: ANTONIO MACHADO DE JESUS FILHO  
Cargo: PRESIDENTE DA CÂMARA

  
Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: MARELISE AMARAL DOS SANTOS  
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/CAU: 168.317/D  
ART/RRT: 1720210542962

Responsável Social  
Nome:  
Cargo:

Responsável Financeiro  
Nome: MONICA LAIS KUZNHARSKI  
Cargo: TECNICA DE CONTROLE



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO: 0      Nº SICONV: 0      APELIDO EMPREENDIMENTO: AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL      NOME DA EMPRESA: TAYWAN DOS PASSOS E CIA LTDA      Nº CTEF: 0

PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE PALMITAL      Período: 15/01/2020 a 29/01/2021      % Realizado Período: 24,43%      % Realizado Acum.: 24,43%

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	SERVÍCIOS PRELIMINARES																									
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																									
4	ESTACAS E BLOCOS																									
5	VIGAS BALDRAMES																									
6	PILARES																									
7	VIGAS																									
8	VERGAS E CONTRA VERGAS																									
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS																									
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS																									
11	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS																									
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									
13	ALVENARIA																									
14	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNO																									
15	ESQUADRIAS																									
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS																									
17	ESCADA																									
18	COBERTURA																									
19	FORRO																									
20	PINTURAS																									
21	ÁREA PERMEAVEL																									
22	LIMPEZA FINAL DA OBRA																									

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	SERVÍCIOS PRELIMINARES																									
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																									
4	ESTACAS E BLOCOS																									
5	VIGAS BALDRAMES																									
6	PILARES																									
7	VIGAS																									
8	VERGAS E CONTRA VERGAS																									
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS																									
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS																									
11	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS																									
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									
13	ALVENARIA																									
14	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNO																									
15	ESQUADRIAS																									
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS																									
17	ESCADA																									
18	COBERTURA																									
19	FORRO																									
20	PINTURAS																									
21	ÁREA PERMEAVEL																									
22	LIMPEZA FINAL DA OBRA																									

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Administração Local																									
2	SERVÍCIOS PRELIMINARES																									
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																									
4	ESTACAS E BLOCOS																									
5	VIGAS BALDRAMES																									
6	PILARES																									
7	VIGAS																									
8	VERGAS E CONTRA VERGAS																									
9	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS																									
10	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS																									
11	LOUÇAS ACESSÓRIOS E METAIS																									
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																									
13	ALVENARIA																									
14	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNO																									
15	ESQUADRIAS																									
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS																									
17	ESCADA																									
18	COBERTURA																									
19	FORRO																									
20	PINTURAS																									
21	ÁREA PERMEAVEL																									
22	LIMPEZA FINAL DA OBRA																									

		Data das Medições																									
		29/01/2021																									
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12														
%		24,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
R\$		28.712,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
%		24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%	24,43%
R\$		28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41	28.712,41

Medições: \_\_\_\_\_  
Período: \_\_\_\_\_  
Acumulado: \_\_\_\_\_

*Mareise Amaral dos Santos*

Responsável Técnico pela Fiscalização  
Nome: MAREISE AMARAL DOS SANTOS  
Profissão: ENGENHEIRA CIVIL  
CREA/CAU: 168.317/D  
ART/RRT: 1720210542962

PALMITAL/PR  
Local: \_\_\_\_\_  
sexta-feira, 29 de janeiro de 2021  
Data: \_\_\_\_\_

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

**EMPRESA:** THAYWAN DOS PASSOS E CIA LTDA-ME

**CNPJ:** 22.373.376/0001-84


**TOMADA DE PREÇOS N°:** 02/2020

**CONTRATO N°:** 10/2020

**MEDIÇÃO:** 01

**DATA:** 29/01/2021

**PERÍODO:** JANEIRO DE 2021.

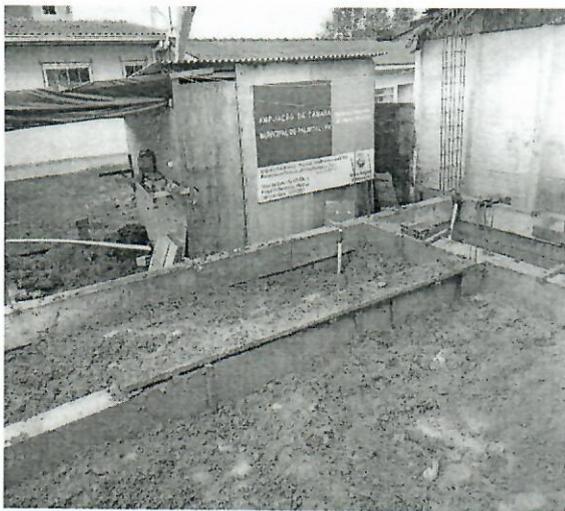

PLACA DE OBRA – SERVIÇOS PRELIMINARES  
IMAGEM 01



EXECUÇÃO DE ALMOXERIFADO – SERVIÇOS  
PRELIMINARES  
IMAGEM 02



VIGAS BALDRAMES – FUNDAÇÕES  
IMAGEM 03




VIGAS BALDRAMES – FUNDAÇÕES  
IMAGEM 04

*m*



VIGAS BALDRAMAS E CAIXARIA  
IMAGEM 05

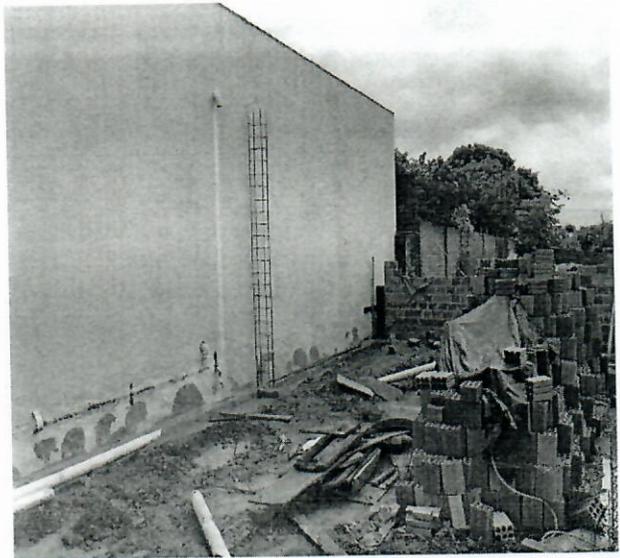

FUNDAÇÃO  
IMAGEM 06

Palmital, 29 de janeiro de 2021.

*Marelise Amaral dos Santos*

Marelise Amaral Dos Santos

CREA-PR 168.345/D
